Hito 2

Consolidación, Validación y Despliegue en Producción

CleanPool App

Equipo: Cleanpool

Sección: 300

Entrega: 29 de abril de 2026

Integrantes: Vicente Araya (PM) | Diego Carmona (SM) | Daniel Cortez | Constanza Malebran

Índice

1. Exposición del Problema y Propuesta de Valor **3**
1.1. Definición del Problema . . . 3
1.2. Contexto y Usuarios Objetivo . . . 3
1.3. Propuesta de Valor y Evidencia . . . 3

2. Requerimientos Funcionales y No Funcionales **3**
2.1. Requerimientos Funcionales . . . 3
2.2. Requerimientos No Funcionales . . . 5

3. Diseño y Justificación Arquitectónica **6**
3.1. Arquitectura del Sistema . . . 6
3.2. Cambios Respecto al Hito Anterior . . . 6
3.3. Decisiones de Diseño y Trade-offs . . . 6
3.4. Problemas Detectados y Soluciones . . . 7

4. Estrategia de Pruebas **7**
4.1. Enfoque General . . . 7
4.2. Plan de Pruebas . . . 7
4.3. Cobertura y Herramientas . . . 8

5. Identificación y Gestión de Riesgos **9**
5.1. Matriz de Riesgos . . . 9
5.2. Riesgos Materializados y Respuesta . . . 9

6. Incremento Funcional y Despliegue **9**
6.1. Funcionalidades Implementadas en este Hito . . . 9
6.2. Entorno de Despliegue . . . 10
6.3. Evidencia de Funcionamiento . . . 11

7. Aplicación de la Metodología Scrum **13**
7.1. Gestión del Sprint (Product Manager) . . . 13
7.1.1. Estado del Product Backlog . . . 14
7.2. Ejecución Scrum (Scrum Master) . . . 15
7.2.1. Daily Meetings . . . 15
7.2.2. Sprint Retrospective — Principales Mejoras . . . 15
7.2.3. Impedimentos y Adaptaciones del Equipo . . . 16
7.3. Registro de Asistencia a Daily Meetings . . . 16

8. Presentación Final Orientada a Stakeholders **17**
8.1. Narrativa del Proyecto . . . 17
8.2. Avances Clave del Hito . . . 17
8.3. Demostración en Producción . . . 17
8.4. Próximos Pasos . . . 17

Anexo A Evidencia de Repositorio **18**

1. Exposición del Problema y Propuesta de Valor

1.1. Definición del Problema

La gestión de la calidad del agua en piscinas residenciales y de pequeña escala suele depender de mediciones manuales esporádicas, lo que dificulta detectar desviaciones de pH, cloro o temperatura a tiempo. Esto afecta a los dueños porque incrementa el riesgo sanitario, el sobreuso de químicos y los costos de mantención. El sistema aborda este problema mediante monitoreo continuo con sensores IoT y recomendaciones accionables desde una aplicación cliente.

1.2. Contexto y Usuarios Objetivo

- **Usuarios principales:** Propietarios particulares de piscinas que desean mantener el agua de sus piscinas en perfectas condiciones, pero que no poseen conocimientos técnicos acerca del mantenimiento en piscinas.
- **Entorno de uso:** Aplicación Flutter multiplataforma conectada a una API FastAPI y MongoDB Atlas, con ingesta de sensores desde dispositivo ESP8266 mediante endpoints protegidos por API key.
- **Necesidad identificada:** Contar con visibilidad continua del estado del agua y soporte de decisiones para tratamiento manual, reduciendo dependencia de chequeos reactivos.

1.3. Propuesta de Valor y Evidencia

Elemento	Descripción
Caso de uso 1	Usuario autenticado consulta estado de su piscina (pH, cloro, temperatura) a partir de lecturas recientes ingresadas manualmente.
Caso de uso 2	Usuario registra tratamiento manual y revisa historial de mantenciones para trazabilidad operativa.
Caso de uso 3	Usuario obtiene temperatura de su piscina en tiempo real a través de sensor de temperatura.
Impacto esperado	El usuario puede mantener en óptimas condiciones el agua de su piscina, además de mejorar la consistencia en decisiones de mantención.
Validación preliminar	El usuario obtiene temperatura de su piscina y además consigue conocimientos necesarios para la mantención de su piscina.

2. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

2.1. Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
Acceso y seguridad de usuarios			
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir registro, inicio de sesión y consulta de perfil autenticado mediante JWT.	Alta
RF-15	Ingreso seguro propietario	El sistema debe implementar autenticación segura para el ingreso del propietario de la piscina.	Alta
Gestión de piscinas y dispositivos IoT			
RF-02	Gestión de piscinas	El sistema debe permitir crear, listar, actualizar y eliminar piscinas asociadas al usuario autenticado.	Alta
RF-05	Ingesta y vínculo de dispositivos	El sistema debe recibir telemetría IoT protegida por API key y permitir vincular/desvincular dispositivos a piscinas.	Media
RF-13	Estado al vincular IoT	El sistema debe mostrar el estado del agua cada vez que se vincule el dispositivo (IoT) a la app.	Media
Medición, evaluación y visualización del estado del agua			
RF-06	Medición de temperatura	El sistema debe medir temperatura del agua.	Alta
RF-07	Comparación con rangos óptimos	El sistema debe comparar automáticamente los valores medidos con rangos óptimos predefinidos para piscinas residenciales.	Alta
RF-08	Indicadores fuera de rango	El sistema debe generar indicadores cuando uno o más parámetros estén fuera de rango seguro, indicando el parámetro afectado con su valor.	Alta
RF-03	Monitoreo de estado	El sistema debe evaluar lecturas de sensores y entregar estado por parámetro y estado global de aptitud.	Alta
RF-12	Aptitud para baño	El sistema debe mostrar en el dashboard si el agua está apta o no apta para el baño, basándose en la evaluación conjunta de los parámetros medidos.	Alta
RF-11	Dashboard móvil	El sistema debe permitir al usuario consultar el estado actual de la piscina desde un dashboard dentro de una app móvil, accesible desde cualquier smartphone.	Alta
RF-10	Historial de mediciones	El sistema debe almacenar el historial de mediciones con identificador de sensor y valor registrado.	Alta
Recomendación y acciones de mantención			

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-09	Recomendación química	El sistema debe recomendar qué producto químico aplicar y en qué cantidad aproximada según volumen de piscina y valores actuales.	Alta
RF-14	Acción recomendada	El sistema debe mostrar la acción recomendada en base a los parámetros del agua.	Alta
RF-04	Mantenciones y tratamientos	El sistema debe calcular dosis de tratamiento manual y persistir historial de mantenciones.	Media

2.2. Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica
RNF-03	Seguridad	Credenciales hasheadas y protección de endpoints con JWT; ingesta IoT protegida por API key.	JWT + bcrypt + API key
RNF-10	Seguridad	El acceso a los datos del usuario requiere autenticación con token válido.	JWT obligatorio
RNF-02	Disponibilidad	Backend desplegable en nube y ejecutable localmente con Docker o Uvicorn.	Entorno local y cloud operativo
RNF-07	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos 90 % semanal.	90 % semanal
RNF-15	Disponibilidad cloud	Disponibilidad mínima de 97 % mensual, excluyendo mantenciones programadas.	97 % mensual
RNF-01	Rendimiento	La API debe responder de manera interactiva en operaciones de consulta y registro.	$<$ 2 segundos promedio
RNF-09	Latencia de actualización	El dashboard debe reflejar nuevos datos con baja latencia desde la captura.	$\leq$ 5 segundos
RNF-13	Rendimiento funcional	La recomendación de productos químicos debe aparecer rápidamente tras la solicitud.	$\leq$ 5 segundos
RNF-08	Precisión	Las mediciones de temperatura deben mantenerse dentro de un margen de error acotado.	Error $< \pm 1\,^{\circ}\mathrm{C}$
RNF-12	Validación de datos	Las lecturas fuera de rango físico deben ser rechazadas antes del almacenamiento.	100 % de rechazo fuera de rango
RNF-04	Usabilidad	Flujo móvil claro entre autenticación, dashboard, perfil y gestión de piscina.	Flujo completo en pocas acciones

ID	Categoría	Descripción	Métrica
RNF-06	Usabilidad	Visualización de pH, cloro y temperatura desde el dashboard.	Indicadores visibles en UI
RNF-14	Compatibilidad móvil	Funcionamiento en iOS 14+ y Android 10+ (o superior).	iOS 14+ / Android 10+
RNF-11	Mantenibilidad	Arquitectura modular por capas para facilitar evolución y corrección.	Separación por capas
RNF-05	Escalabilidad	Diseño desacoplado frontend/backend y persistencia en MongoDB Atlas.	Escalado horizontal por servicio

3. Diseño y Justificación Arquitectónica

3.1. Arquitectura del Sistema

La arquitectura se compone de: (1) cliente Flutter (móvil) como capa de presentación; (2) API REST FastAPI como capa de aplicación; (3) MongoDB Atlas como persistencia; y (4) integración de ingesta IoT mediante endpoints versionados con autenticación por API key para dispositivos. El backend expone además autenticación JWT para usuarios finales y servicios de negocio para evaluación de estado y mantenciones.

3.2. Cambios Respecto al Hito Anterior

Componente	Estado anterior	Estado actual
Backend API	Endpoints base de autenticación/lecturas y estructura inicial.	Se consolidan routers para ingesta IoT, vinculación de dispositivos, piscinas de usuario y mantenciones.
Cliente Flutter	Flujo inicial de interfaz y consumo básico de API.	Se estructura por features con servicios compartidos para auth, pool y mantenciones, incluyendo persistencia local de sesión.
Placa arduino	Uso de arduino ESP32	Uso de arduino ESP8266
Conexion esp8266 con App	Access point desde esp82666 para conexión con la app	esp8266 se conecta a red Wifi y asi manda datos con protocolo HTTP al backend de la app

3.3. Decisiones de Diseño y Trade-offs

Decisión	Justificación	Trade-off asumido
REST (FastAPI) vs GraphQL	Menor complejidad operativa y rapidez de implementación para endpoints orientados a recursos del dominio.	Simplicidad y estandarización HTTP, a cambio de menor flexibilidad en agregación de consultas complejas.
Monolito modular vs microservicios	Tamaño del equipo y del dominio favorecen una base única con routers/servicios separados por responsabilidad.	Menor costo de despliegue y coordinación, a cambio de mayor riesgo de crecimiento acoplado si no se controla deuda técnica.

3.4. Problemas Detectados y Soluciones

Problema detectado	Solución implementada
No se pudo hacer funcionar el sensor de ph ya que era imposible de calibrar.	Se mantiene sensor de temperatura funcionando
Inconsistencia entre rutas históricas y rutas actuales en pruebas heredadas.	Se mantiene cobertura principal con tests específicos por módulo (pools, mantenciones, status) y se documenta el desfase para normalizar endpoints.
El arduino no lograba enviar los datos del sensor de temperatura a la aplicación	Se modificó el endpoint necesario apuntando al backend desplegado para mostrar temperatura en aplicación
El modelado 3D del diseño al principio generó problemas de impresión que hicieron que no se pudiera imprimir por ancho de paredes	Se ajustaron las medidas del modelo del flotador en tinkercad para ser impreso en 3D

4. Estrategia de Pruebas

4.1. Enfoque General

Se adopta un enfoque mixto con pruebas unitarias y de integración en backend usando Pytest, FastAPI TestClient y mocks de MongoDB para desacoplar dependencias externas. En frontend existe prueba base de widget para validar arranque. La priorización se centra en autenticación, estado de piscina, mantenciones y configuración de pools.

4.2. Plan de Pruebas

ID	Tipo / Módulo	Descripción	Resultado
TP-01	Unitaria – status_service	Valida cálculo de estado global de aptitud desde estados de parámetros.	*[Implementada en repositorio]*
TP-02	Unitaria – pools/settings	Verifica defaults y validaciones de configuración de piscina en modelos y endpoints de pools.	*[Implementada en repositorio]*
TP-03	Integración – auth + mantenciones	Comprueba flujo autenticado para crear/listar mantenciones y restricciones sin token.	*[Implementada en repositorio]*
TP-04	Integración – test_api legado	Incluye casos sobre /readings que no coinciden completamente con routers activos en main.	*[Requiere alineación]*
TP-05	Sistema – frontend widget test	Valida construcción básica de la app Flutter en entorno de pruebas.	*[Implementada en repositorio]*
TP-06	Unitaria – config_pool/evaluar_sensor	Evalúa rangos y clasificación de estado (OPTIMO, ADVERTENCIA, CRITICO), incluyendo error por sensor no reconocido.	*[Implementada en repositorio]*
TP-07	Unitaria – services/calculator	Valida aptitud global, estado individual, validación de volumen y reglas combinadas de dosificación (orden pH → cloro).	*[Implementada en repositorio]*
TP-08	Unitaria – config/Settings	Verifica validación de SECRET_KEY y aplicación de valores por defecto de configuración.	*[Implementada en repositorio]*
TP-09	Unitaria – routers/ingesta	Cubre verify_api_key, persistencia de is_critical y rechazo de payload legacy con pH fuera de rango físico.	*[Implementada en repositorio]*
TP-10	Unitaria – routers/device_bindings	Cubre vínculo/desvínculo, estado de dispositivo (online/offline) e ingesta por device_id con y sin binding activo.	*[Implementada en repositorio]*

4.3. Cobertura y Herramientas

- **Herramientas utilizadas:** Pytest, FastAPI TestClient, unittest.mock (backend) y flutter_test (frontend).
- **Cobertura de código alcanzada:** Se añadieron 26 pruebas unitarias nuevas para backend (config_pool, services/calculator, config/settings, routers/ingesta y routers/device_bindings), todas en estado *pass* al ejecutarse de forma aislada.
- **Criterio de aceptación:** Los módulos críticos (auth, estado de piscina, mantenciones, pools) y módulos base de lógica/ingesta deben contar con pruebas automatizadas; las pruebas legacy desalineadas deben normalizarse con los endpoints vigentes.

5. Identificación y Gestión de Riesgos

5.1. Matriz de Riesgos

ID	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación	Estado
R-01	Dependencia de servicios externos (MongoDB Atlas / nube) para operación continua.	Media	Alto	Mantener variables de entorno claras, validación de conexión y plan de contingencia para entorno alternativo/local.	Activo
R-02	Desfase entre rutas legacy y rutas vigentes en pruebas/documentación.	Media	Medio	Homologar contratos API, depurar endpoints en desuso y actualizar suite de pruebas.	Activo
R-03	CORS completamente abierto en backend en un eventual despliegue público.	Media	Medio	Restringir orígenes permitidos y endurecer configuración por entorno.	Activo
R-04	Deuda técnica por duplicidad de modelos/colecciones (piscinas/pools, mantenciones/mantenimientos).	Media	Medio	Planificar refactor de unificación de dominio y normalización de repositorios.	Activo

5.2. Riesgos Materializados y Respuesta

Se observa materialización parcial del riesgo de inconsistencia técnica entre componentes legacy y actuales (por ejemplo, rutas probadas históricamente versus routers incluidos en la aplicación). El impacto principal es aumento de costo de mantenimiento y ambigüedad documental. Como respuesta, se prioriza normalización de contratos API, consolidación de nomenclatura de colecciones y actualización de pruebas de integración.

6. Incremento Funcional y Despliegue

6.1. Funcionalidades Implementadas en este Hito

ID	Historia de usuario	Descripción	Estado
HU-01	Como propietario quiero gestionar multiples piscinas desde una sola cuenta	**Completa**	
HU-02	Como propietario quieri ver el indicador APTA / NO APTA para baño en el dashboard de forma prominente	**Completa**	
HU-03	Como dueño de la piscina quiero que se guarde un registro de mantenimientos de mi piscina para poder revisar y analizarlas posteriormente	**Completa**	
HU-05	Como sistema quiero exponer las lecturas del dispositivo IoT via HTTP para que la app pueda consumirlas	**Completa**	
HU-06	Como usuario quiero ver los datos del esp8266 en la app y que se queden registrados en el sistema para monitorear mi piscina	**Completa**	
HU-07	Como usuario quiero que el sistema funcione correctamente en cualquier funcionalidad para confiar en las mediciones y recetas de mantenimiento	**Completa**	
HU-09	Como usuario quiero poder abrir y cerrar el dispositivo facilmente para conectarme a el a traves de la app	**Completa**	

6.2. Entorno de Despliegue

Parámetro	Detalle

Plataforma	Azure Web App (backend) y despliegue frontend web por configuración Docker/Nginx y Vercel SPA config en repositorio.
URL de acceso	*[https://frontendappsoft2.vercel.app]*
Credenciales de prueba	*[Usuario: admin y contraseña: cleanpool2026]*
Estado al momento de entrega	Backend y frontend corriendo de manera estable en sus respectivos hostings
Notas adicionales	Endpoints de usuario requieren Bearer JWT; ingesta de sensores requiere header X-API-KEY.

6.3. Evidencia de Funcionamiento

Incluir capturas de pantalla o descripciones de las funcionalidades clave en el entorno de producción. Las capturas correspondientes están adjuntas a continuación.

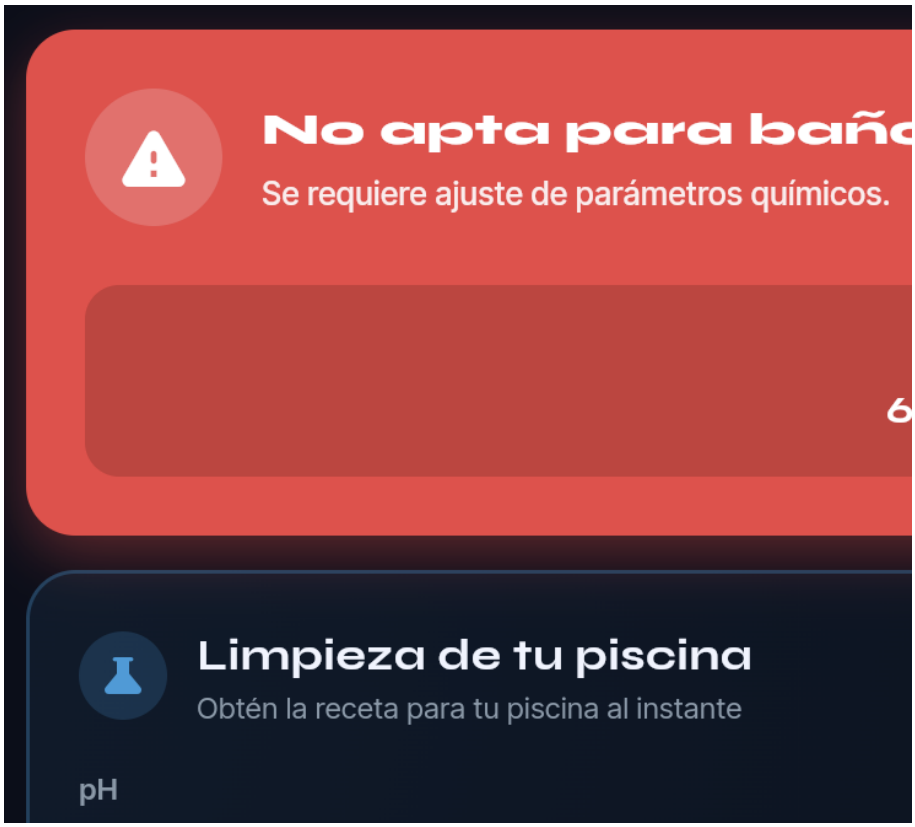

Figura 1: Evidencia de funcionamiento: captura 01.

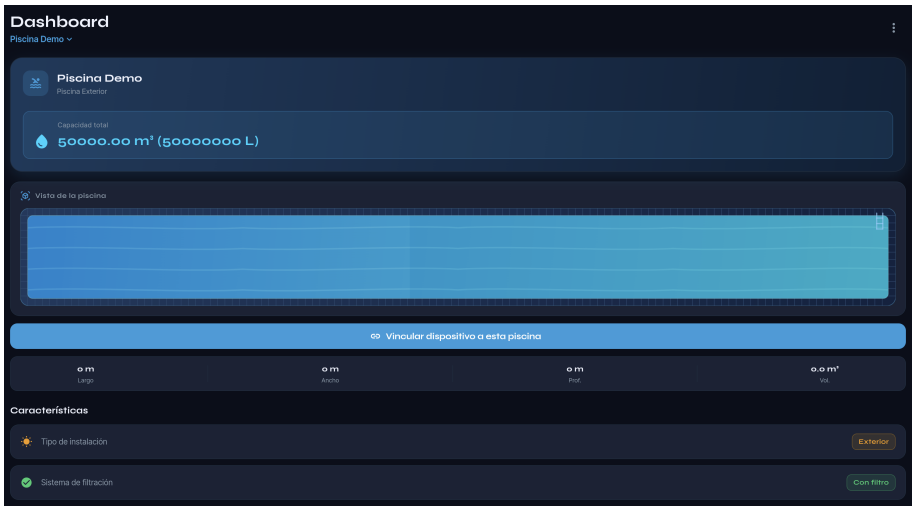

Figura 2: Evidencia de funcionamiento: captura 02.

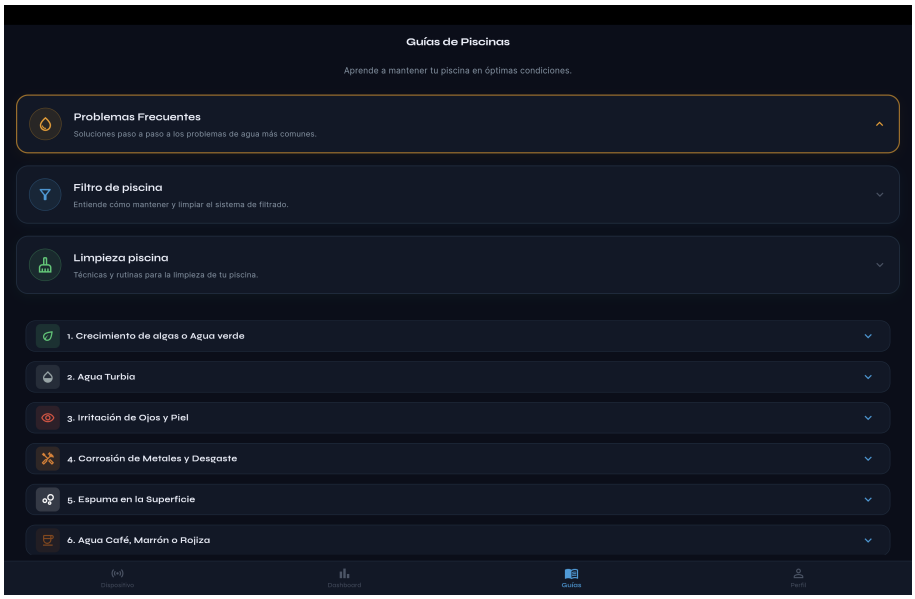

Figura 3: Evidencia de funcionamiento: captura 03.

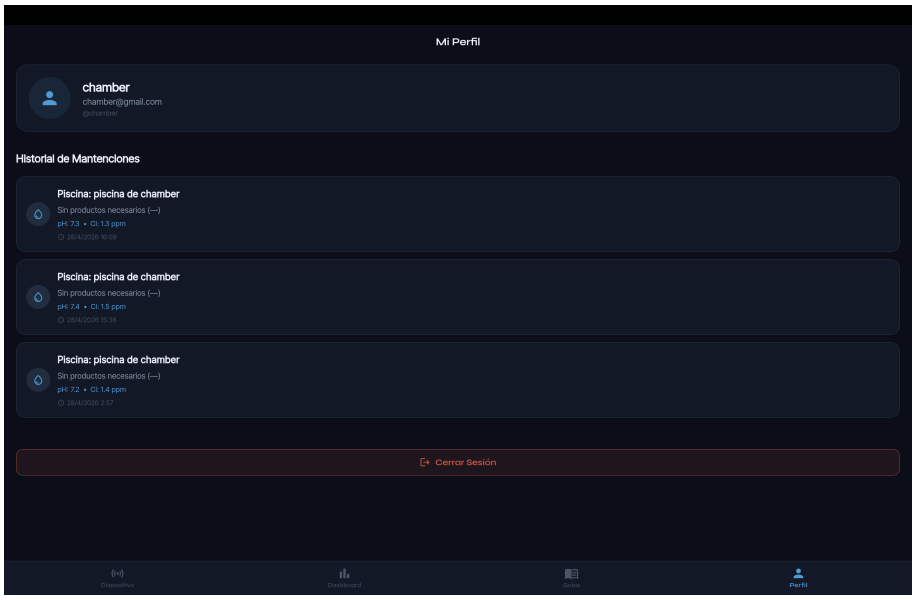

Figura 4: Evidencia de funcionamiento: captura 04.

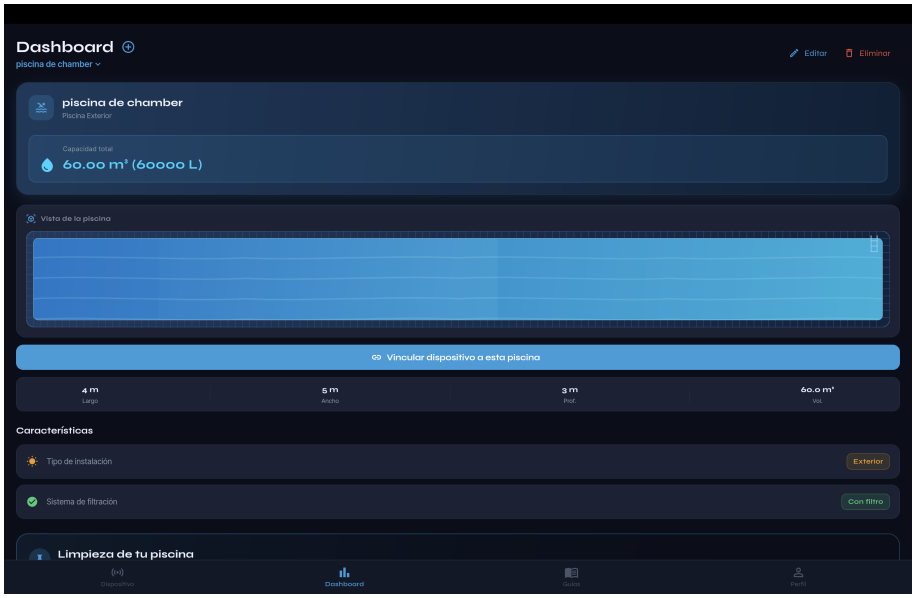

Figura 5: Evidencia de funcionamiento: captura 05.

Se puede evidenciar el flujo completo: registro/login, visualización de estado de piscina en dashboard, ejecución de tratamiento manual y revisión de historial de mantenciones, además del registro de datos de sensores en backend vía endpoints de ingesta.

7. Aplicación de la Metodología Scrum

7.1. Gestión del Sprint (Product Manager)

Parámetro	**Detalle**
Número de sprint	3
Objetivo del sprint	Implementar el sistema IoT a la solución y vincularla con la app móvil.
Grado de cumplimiento	80 %
Ajustes realizados	Se priorizó el desarrollo del flotador con impresión 3D y el funcionamiento del sensor de temperatura para visualizar los datos en la app.
Objetivo del siguiente sprint	Implementar al menos el sensor de pH, realizar pruebas funcionales del flotador y lograr un MVP del producto final.

Estado del Product Backlog

ID	**Historia de usuario**	**Sprint asignado**	**Estado**
HU-01	Como propietario quiero gestionar multiples piscinas desde una sola cuenta		**Completa**
HU-02	Como propietario quieri ver el indicador APTA / NO APTA para baño en el dashboard de forma prominente		**Completa**
HU-03	Como dueño de la piscina quiero que se guarde un registro de mantenimientos de mi piscina para poder revisar y analizarlas posteriormente		**Completa**
HU-04	Como propietario de la piscina quiero los parametros de ph, cloro y temperatura, se obtengan automaticamente desde los sensores para asegurar mayor prescision y agilidad		**Parcial**
HU-05	Como sistema quiero exponer las lecturas del dispositivo IoT via HTTP para que la app pueda consumirlas		**Completa**
HU-06	Como usuario quiero ver los datos del esp8266 en la app y que se queden registrados en el sistema para monitorear mi piscina		**Completa**
HU-07	Como usuario quiero que el sistema funcione correctamente en cualquier funcionalidad para confiar en las mediciones y recetas de mantenimiento		**Completa**

ID	Historia de usuario	Sprint asignado	Estado
HU-08	Como dueño de la piscina quiero un dispositivo flotando que permita que el dispositivo con sensores flote en el agua para usar el servicio sin riesgo a daños	**Parcial**	
HU-09	Como usuario quiero poder abrir y cerrar el dispositivo facilmente para conectarme a el a traves de la app	**Completa**	
HU-10	Como usuario quiero que el dispositivo sea resistente al agua para evitar daños y asegurar su funcionamiento continuo en la piscina	**Parcial**	
HU-11	Como usuario quiero que el dispositivo funcione correctamente al integrarlo con los sensores y el esp8266 para obtener mediciones confiables	**Parcial**	
HU-12	Como usuario quiero que el dispositivo funcione correctamente en condiciones reales para congiar en su uso	**Parcial**	

7.2. Ejecución Scrum (Scrum Master)

Daily Meetings

Las reuniones diarias se realizaron con una frecuencia de lunes a miercoles a las 13:00 horas, manteniendo una duración promedio de 15 minutos. La modalidad fue presencial durante los bloques de clases en la universidad. La disciplina del equipo se vio comprometida por temas personales de algunos integrantes del grupo, pero se cumplió diariamente con todas las daily meeting.

Sprint Retrospective — Principales Mejoras

Aspecto	Acción tomada
Baja asistencia y puntualidad: Falta de compromiso detectada en los bloques presenciales, lo que retrasaba la toma de decisiones.	*Se instauró un sistema de reporte obligatorio asíncrono; en caso de inasistencia, el integrante debe enviar su estado de avance antes de la Daily.*

Falta de visibilidad del avance real: Incertidumbre sobre el estado de las tareas de los compañeros, provocando duplicidad de esfuerzos.	*Implementación estricta del Tablero Taiga; ninguna tarea se considera en curso sin su respectivo movimiento en el tablero digital.*
Cuellos de botella en la integración: Descoordinación entre los desarrolladores de Backend y Frontend que generaba errores al final del sprint.	*Se crearon Çheckpoints de Confianza.ºbligatorios a mitad de semana para validar la comunicación de los componentes antes de la entrega final.*

Impedimentos y Adaptaciones del Equipo

Sincronización de horarios: El principal impedimento fue el choque de horarios con otras asignaturas/trabajo, limitando las ventanas de trabajo conjunto. El equipo se adaptó desplazando las discusiones técnicas extensas a sesiones remotas nocturnas, optimizando el tiempo presencial.

Conflictos en el Control de Versiones: Se detectaron problemas de sobreescritura en el repositorio Git por falta de dominio del flujo de ramas. Se realizó una capacitación técnica interna sobre GitFlow, estableciendo reglas de protección para la rama main y protocolos de pull request que garantizaron la integridad del código.

Dependencia Externa de Equipamiento: La incertidumbre en los tiempos de respuesta del equipo de impresión 3D generó retrasos en el ensamblaje físico. Como adaptación, el equipo de software procedió a trabajar con datos simulados y prototipos digitales en Tinkercad, permitiendo avanzar en la lógica de la aplicación mientras el hardware se encontraba en fase de validación externa.

7.3. Registro de Asistencia a Daily Meetings

Nota: Este componente tiene alto peso evaluativo. El registro debe ser completo, individual y reflejar la participación real del equipo.

Integrante	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Asistidas	%
Vicente Araya(PM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	100 %
Diego Carmona(SM)	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	5/7	71 %
Daniel Cortez	×	✓	✓	×	✓	×	×	3/7	43 %
Constanza Malebran	×	×	×	✓	×	×	×	1/7	14 %

Justificación de inasistencias:

- **Diego Carmona, D5:** *Examen epilepsia*

- **Diego Carmona, D6:** *Compromiso personal*
- **Daniel Cortez, D1,D4,D6,D7:** *Motivos personales*
- **Constanza Malebran, D1,D2,D3,D5,D6,D7:** *Trabajo*

8. Presentación Final Orientada a Stakeholders

8.1. Narrativa del Proyecto

CleanPool App aborda el problema de control reactivo de calidad de agua en piscinas, entregando monitoreo digital y apoyo a decisiones de mantención para usuarios responsables de operación. En este hito se consolidó una arquitectura operativa con frontend Flutter, backend FastAPI y persistencia en MongoDB Atlas, incorporando autenticación, gestión de piscinas, ingesta IoT, evaluación de estado y registro de mantenciones. El valor entregado es una base funcional desplegable que centraliza información crítica y mejora la trazabilidad de acciones técnicas.

8.2. Avances Clave del Hito

- Se logro hacer funcionar el sensor de temperatura y mostrarlo en la app.
- Se diseñó e imprimió un modelo de flotador en 3D para el dispositivo IoT.
- La esp8266 funciona correctamente y se comunica con el backend via HTTP y funciona sin estar conectada a un PC.

8.3. Demostración en Producción

El sistema se encuentra desplegado y disponible para evaluación en: ***[URL no especificada en repositorio]***.
Credenciales de acceso para la demo: **Usuario:** *[No disponible en repositorio]* **Contraseña:** *[No disponible en repositorio]*

Flujo:(1) registro/inicio de sesión, (2) creación/selección de piscina, (3) revisión de estado actual y métricas, (4) ejecución de tratamiento manual, (5) validación de historial de mantenciones y (6) Visualización de temperatura en la app.

8.4. Próximos Pasos

1. Implementar el sensor de ph y cloro para mostrar esas mediciones en la app.
2. Iterar el flotador en base a pruebas reales en agua para encontrar el modelo definitivo.
3. Mejorar la UX dentro la app para el usuario final.

Anexo A. Evidencia de Repositorio

Recurso	**URL**
Repositorio (GitHub)	*[https://github.com/vicentearaya/software2.git]*
Tablero Scrum (Taiga)	*[https://tree.taiga.io/project/danielgcf21-clean-pool/taskboard/sprint-3-10490]*
Sistema desplegado	*[https://frontendappsoft2.vercel.app]*
